

Was bisher geschah, was ich gelernt habe und wo wir stehen

Die ganze Arbeit seit dem 25. September 2026, über alle Projekte und Chats hinweg. Ohne Fachwissen lesbar, zum Ausdrucken in Schwarz-Weiß und zum Abheften in acht Registern.



Durchgezogen schwarz = erledigt · dicker Rahmen = läuft jetzt · gestrichelt = teilweise vorgezogen · dünn = kommt noch

STAND	Mittwoch, 30. September 2026, 11 Uhr
FÜR	Elias Wagner (Chef)
VERFASST VON	Kommandeur Stahl (Claude, die KI, die baut und prüft)
UMFANG	5 GitHub-Ablagen, 16 Arbeitssitzungen, 25. bis 30. September 2026
WICHTIG	Alle Euro-Beträge sind Platzhalter. Nichts wurde bisher verkauft, das ist Absicht.

Registerverzeichnis

Der Bericht ist in acht Register geteilt. Jedes Register beginnt mit einem Trennblatt und hat eigene Seitenzahlen (zum Beispiel C-3). Am rechten Rand zeigt eine schwarze Marke, in welchem Register man gerade ist. Nichts wird später herausgenommen: Neues kommt als datierter **Nachtrag** hinter das passende Register, so bleibt die ganze Entwicklung sichtbar. Welche Nachträge es gibt, steht im Nachtragsverzeichnis gleich hinter diesem Blatt.

A	Überblick	Das Wichtigste auf einer Seite, worum es geht, wer was macht, Wörterbuch
B	Chronik	Zeitleiste 25.–30.09., alle 16 Arbeitssitzungen mit Ergebnis, Umfang in Zahlen
C	Projekte	Die fünf Vorhaben (URFA, Brüder-Wettbewerb, Grundausrüstung, Fernspäher, Website-Business) und alle gebauten Seiten
D	Arbeitsweise und Qualität	Ablauf eines Auftrags, Bauzeiten, Qualitätssystem, die große Probe OSG
E	Wissen und Lehren	Was ich gelernt habe, wo das Wissen gesammelt wird
F	Geld	Preismodell, Preisbeispiele, bisherige Kosten und Verbrauch
G	Plan und Entscheidungen	Gesamtplan mit Position, offene Entscheidungen, nächste Schritte
H	Anhang	Ablageorte, Vorschau-Links, Quellen dieses Berichts

Am Ende liegt ein Einleger: Beschriftungsstreifen für Registerblätter und ein Rückenschild für den Ordner.

A

B

C

D

E

F

G

H

A

Überblick

Für alle, die in fünf Minuten wissen wollen, worum es geht und wo wir stehen.

A1 · Das Wichtigste auf einer Seite

A2 · Worum es geht

A3 · Wer was macht

A4 · Kleines Wörterbuch

A1 Das Wichtigste auf einer Seite

≈ 5 Tage Arbeit, 25.–30.09.2026	16 Arbeitssitzungen mit Claude in 5 Ablagen	224 gespeicherte Arbeitsschritte (Commits)
11 gebaute Websites und Varianten	125 Qualitätsregeln aus 90 Quellen	0 € Umsatz: Verkauf kommt bewusst zuletzt

- **Die Idee:** Unter dem Namen **OQ („Ohne Quote“)** baut Elias mit Hilfe einer KI hochwertige Websites für Betriebe und betreut sie danach gegen eine Monatsgebühr.
- **Wie es anfang:** Am 25.09. abends mit der Website eines echten Restaurants (URFA SOFRASI). Danach folgten ein Wettbewerb dreier KI-„Brüder“ um die Seite eines Friseurs, eine eigene Grundausstattung für Claude und ein Späher-Trupp, der fremde Seiten prüft. Ab dem 28.09. lief alles in der Zentrale „website-business“ zusammen.
- **Der Stand:** Das Können ist aufgebaut und belegt. Eine Website entsteht heute in unter einer Stunde (einfach) bis rund einem Tag (aufwendig). Die größte Probe, der Neubau der Seite eines echten Werkzeugherstellers, hat eine strenge Jury bestanden.
- **Wo wir im Plan stehen:** in **Phase 2 von 6, „Entscheiden“**. Jetzt muss Elias Preise, Zielgruppe und Namen festlegen. Zehn Fragen liegen bereit (Register G).
- **Was noch fehlt:** Firma, Konten, Verträge, echte Preise und zahlende Kunden. Das kommt in den Phasen 4 und 5.

A

B

C

D

E

F

G

H

A2 Worum es geht

Viele kleine Betriebe (Restaurant, Friseur, Praxis, Handwerker) haben eine Website, die auf dem Handy langsam ist, schlecht aussieht oder wichtige Dinge versteckt: Telefonnummer, Weg, Öffnungszeiten. Eine gute Agentur ist teuer und langsam, und nach dem Start kümmert sich oft niemand mehr um die Seite.

OQ setzt dort an. Die KI Claude baut die Seiten nach festen Regeln und prüft sie streng. Elias entscheidet, bestätigt Preise und hält den Kontakt zu den Kunden. Geld kommt auf zwei Wegen herein: einmal für den Bau der Seite, danach jeden Monat für die Betreuung (das „Abo“).




Bild 1 · So soll OQ Geld verdienen. Das Abo (Schritt 4) ist das Fundament, weil es jeden Monat wiederkommt.

DER GRUNDSATZ VON ELIAS

Am 28.09. hat Elias entschieden: *Erst das Können aufbauen, dann verkaufen*. Deshalb gibt es bisher keine Firma, keine Preise und keine Kunden, aber elf gebaute Websites und ein geprüftes System.

A3 Wer was macht

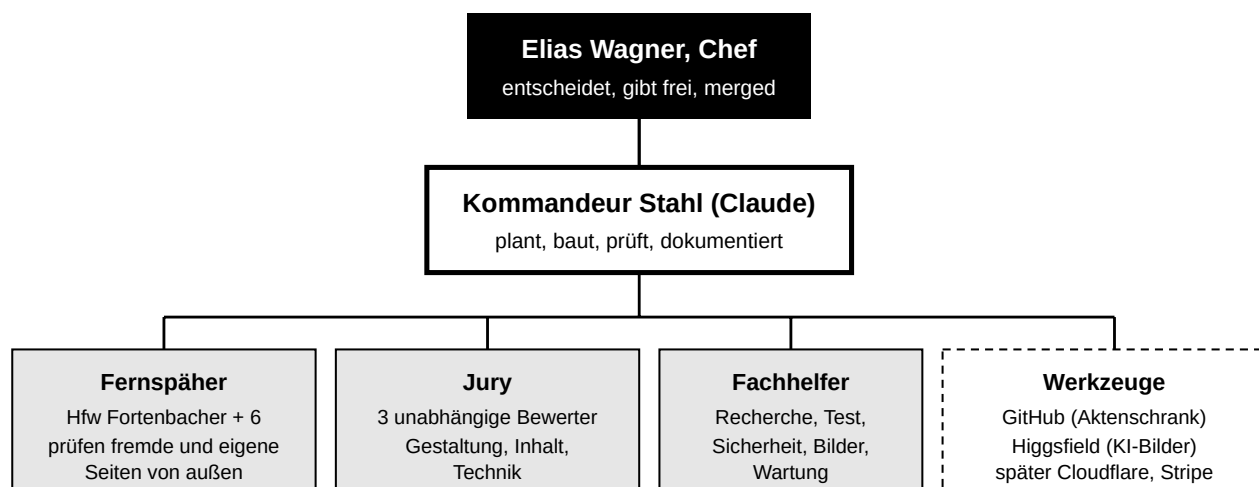


Bild 2 · Elias hat das letzte Wort. Claude arbeitet selbstständig und setzt für Teilaufgaben eigene Helfer (Agenten) ein.

Zwei feste Regeln gelten immer: **Kostenpflichtige Dinge** (zum Beispiel KI-Bilder bei Higgsfield) nur mit Elias' ausdrücklicher Erlaubnis. **Unumkehrbares** (Seite live schalten, E-Mails an Kunden, Löschen) nur auf seine Anweisung.

A4 Kleines Wörterbuch

Website / Seite

Der Internetauftritt eines Betriebs, oft mit mehreren Unterseiten (Start, Angebot, Kontakt).

Claude

Die KI von Anthropic, die hier als „Kommandeur Stahl“ auftritt, Websites baut und prüft.

Sitzung / Chat

Ein Arbeitsgespräch mit Claude. Jede Sitzung hat ihr eigenes Gedächtnis; was bleiben soll, wird in Dateien festgehalten.

Agent / Helfer

Eine weitere KI-Instanz mit einer Einzelaufgabe, etwa „prüfe die Sicherheit“ oder „bewerte die Gestaltung“.

GitHub, Repo, Ablage

Ein Online-Aktenschränk. Ein „Repo“ ist ein Ordner darin. Es gibt fünf: urfa, Brüder-Wettbewerb, claude-setup, Fernspäherkommando, website-business.

Commit

Ein gespeicherter Arbeitsschritt mit Beschreibung, wie ein Eintrag im Bautagebuch.

Branch und PR

Neue Arbeit entsteht auf einer Kopie (Branch). Ein „Pull Request“ (PR) ist der Antrag, sie zu übernehmen. Elias genehmigt ihn („mergen“).

Auftragslog

Die Liste aller Aufträge mit Nummer (A-001 bis heute A-055), Ergebnis und Stand.

Hosting

Der Rechner im Internet, auf dem die fertige Seite liegt. Geplant: Cloudflare, für kleine Seiten meist kostenlos.

Lighthouse

Ein Prüfprogramm von Google: 0 bis 100 Punkte für Tempo, Barrierefreiheit, gute Technik und Auffindbarkeit.

SEO

„Suchmaschinen-Optimierung“: die Seite so bauen, dass Google sie versteht und gut findet.

GEO

Dasselbe für KI-Suchen wie ChatGPT: Fakten klar und nachprüfbar auf die Seite schreiben.

Barrierefreiheit

Die Seite ist auch mit Sehschwäche, nur mit Tastatur oder mit Vorlesehilfe benutzbar.

Musterseite

Eine Vorzeigeseite für einen erfundenen Betrieb, später Teil des Portfolios.

Vorschau-Link

Ein privater Link, unter dem Elias eine Seite im Browser ansehen kann, ohne dass sie öffentlich im Netz steht.

Higgsfield, Credits

Ein Dienst für KI-Bilder und KI-Filme. Beahlt wird mit Guthaben („Credits“).

Jury-Schleife

Drei Bewerter vergeben Punkte, Claude verbessert, die Jury prüft erneut, bis eine Schwelle erreicht ist.

Quality Gate

Die Schlussprüfung: Erst wenn jede bestellte Regel mit Beleg erfüllt ist, gilt eine Seite als fertig.

A**B****C****D****E****F****G****H**

A

B

C

D

E

F

G

H

B

Chronik

Was wann passiert ist, über alle Projekte und Chats hinweg.

B1 · Zeitleiste in einem Bild

B2 · Alle 16 Arbeitssitzungen

B3 · Umfang in Zahlen

B1 Zeitleiste in einem Bild

-
- 25.09. ● **Erste echte Website: URFA SOFRASI (Restaurant)**
Zwei Varianten, Speisekarte mit 90 Gerichten, erste Regeln und Stolperfallen
- 26.09. ● **Brüder-Wettbewerb: Hairstyle by Ümit (Friseur)**
Drei KI-„Brüder“ bauen parallel, bestes Ergebnis 99/100/100/100 bei Google Lighthouse
- 27.09. ● **Werkzeugkasten: Claude-Grundausrüstung und Fernspähertrupp**
Prüfprogramme, Schutzregeln, Helfer; Meisterseite in 16 Stunden mit 9 Prüfrunden
- 28.09. ● **Zentrale „website-business“ gegründet, Trainingsplan beschlossen**
Vorlage mit Bausteinen, drei Musterseiten, Außenprüfung. Entscheidung: erst Können, dann Verkauf
- 29.09. ● **Generalprobe und Business-Plan OQ**
Restaurant-Seite in 38 Minuten, Portfolio in 33 Minuten, KI-Bilder getestet, Notizen zu OQ gesichert, Preisformeln und Plan mit 6 Phasen, Portfolio überarbeitet
- 30.09. ● **Qualitätssystem und große Probe (heute)**
125 Regeln aus 90 Quellen; Neubau Werkzeughersteller OSG in rund 10 Stunden, Jury bestanden mit 75,75 von 100; dieser Bericht

Bild 3 · Sechs Tage im Überblick. Jede Stufe baute auf der vorigen auf.

A

B

C

D

E

F

G

H

B2 Alle 16 Arbeitssitzungen

Die ersten sieben Sitzungen liefen als einzelne Chats außerhalb dieses Projekts, jede mit eigener Ablage. Ab dem 28.09. arbeitet alles im Projekt „Website Business“ zusammen, das die Ergebnisse der früheren Chats übernommen hat.

BEGINN	SITZUNG	WO	ERGEBNIS
25.09.	URFA SOFRASI Website	urfa	Analyse der alten Seite, Neubau Variante 1 dunkel mit Original-Logo, Speisekarte mit 90 Gerichten
26.09.	URFA Variante 2, hell	urfa	zweite Variante hell und grün, eigenes Vektor-Logo, 33 dokumentierte Gestaltungsfehler; Lighthouse Barrierefreiheit 94 → 100
26.09.	Brüder-Wettbewerb, Bruder A	Brüder	Regelwerk, Werkzeuge und Schnellbefehle für alle drei; eigene Seite „dunkel und edel“
26.09.	Bruder B	Brüder	Seite „farbig und verspielt“, Lighthouse 99/100/100/100
27.09.	Bruder C	Brüder	Seite „hell und ruhig, Licht und Marmor“, 9 Prüfrunden, Jury 54 → 56 von 60, Maßstab für „fast makellos“
27.09.	Grundausrüstung prüfen	claude-setup	Setup-Skript für jede neue Sitzung: 5 Helfer, Schutzregeln, Browser-Werkzeuge. Ein erster Start scheiterte, der zweite lief
27.09.	Fernspäherkommando	Fernspäher	Hfw Fortenbacher und 6 Späher mit eigenem Browser; erster Einsatz: Agentur-Seite legencymedia.com
28.09.	Grobplan Website-Business	Projekt	Zentrale gegründet: Vorlage, Musterseiten, Generalprobe, Business-Plan, Portfolio (viele Aufträge in einer Sitzung)
29.09.	Higgsfield-Bilder herunterladen	Projekt	KI-Bilder für die Musterseiten gesichert
29.09.	Notizen OQ sichern	Projekt	Elias' Notizen zur Firma wortgetreu und geordnet abgelegt
29.09.	Preisformeln	Projekt	drei Rechenwege, Gewichte, Rechner, Konfigurator-Ablauf
29.09.	YouTube-Video auswerten	Projekt	„Scroll-Film“ als Gestaltungsmittel, 8 Muster ins Wissen
29.09.	Vorschau-Link Portfolio	Projekt	private Links für Portfolio und Musterseiten
29.09.	Überarbeitung eigene Seite	Projekt	Kino-Einstieg mit KI-Film, Website-Generator mit Reglern
29.09.	Knowledge und Quality System	Projekt	125 Regeln, 90 Quellen, Pflichtenheft und Quality Gate
30.09.	OSG Europe Neubau mit Jury	Projekt	8 Seiten in rund 10 Stunden, Jury 75,75 von 100, Preis-Einstufung, NORVAK

A**B****C****D****E****F****G****H**

WAS ICH NICHT SEHEN KANN

Ich sehe alle Claude-Code-Sitzungen und alle fünf Ablagen auf GitHub. Normale Chats in der Claude-App außerhalb von Claude Code (zum Beispiel reine Fragen ohne Ablage) sind für mich nicht einsehbar. Gibt es solche Chats mit wichtigen Ergebnissen, genügt es, mir den Inhalt zu schicken; ich ordne ihn dann in das passende Register ein.

A

B

B3 Umfang in Zahlen

VORHABEN	ZEITRAUM	SITZUNGEN	COMMITTS
URFA SOFRASI	25.–27.09.	2	30
Claude-Grundausstattung	27.09.	1	2
Brüder-Wettbewerb	26.–28.09.	3	54
Fernspäherkommando	27.–28.09.	1	5
Website-Business, Teil 1	28.–29.09.	4	97
Website-Business, Teil 2	29.–30.09.	5	36
SUMME	≈ 5 TAGE	16	224

C

D

E

F

G

H

Quelle: Sitzungsliste und Git-Historie, Stand 30.09.2026, 11 Uhr. Der gescheiterte erste Setup-Start und diese Berichtssitzung sind nicht mitgezählt.

A

B

C

D

E

F

G

H

C

Projekte

Die fünf Vorhaben, wie sie zusammenhängen, und jede gebaute Seite.

C1 · Wie die Vorhaben zusammenhängen

C2 · URFA SOFRASI

C3 · Brüder-Wettbewerb

C4 · Grundausstattung und Fernspäher

C5 · Website-Business (OQ)

C6 · Alle gebauten Seiten

C1 Wie die Vorhaben zusammenhängen

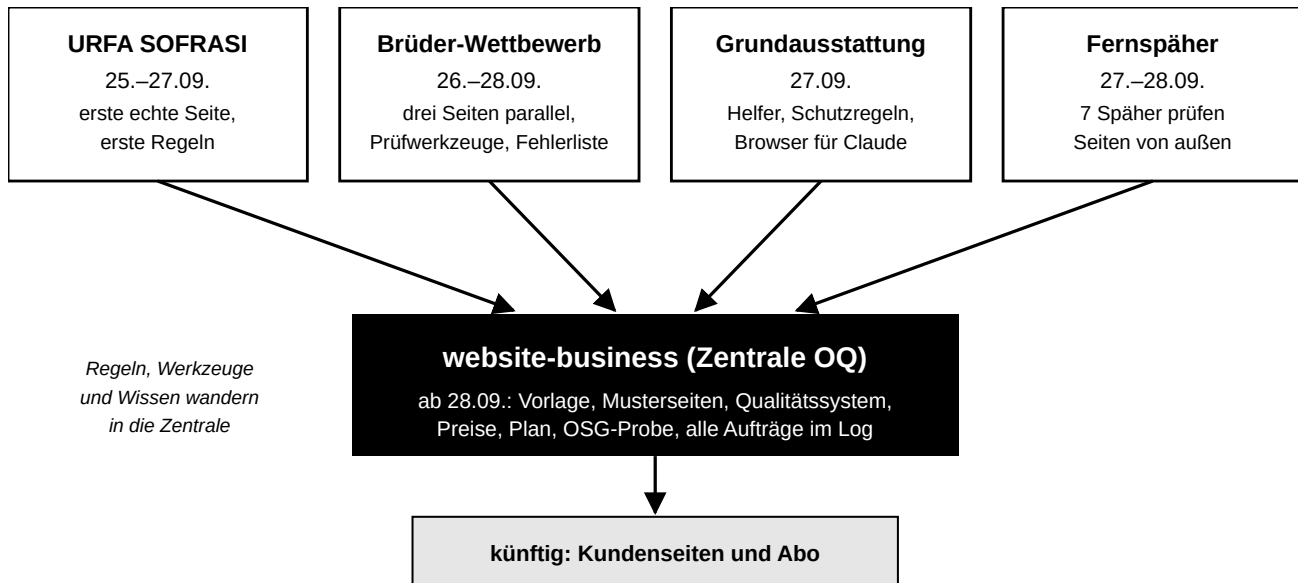


Bild 4 · Vier Vorarbeiten in eigenen Ablagen, eine Zentrale. Die Originale bleiben unverändert erhalten; die Zentrale arbeitet mit Kopien.

C2 URFA SOFRASI (Restaurant)

Was: Die bestehende Website eines türkischen Restaurants modern, übersichtlich und schnell neu bauen, „gleiche Identität, moderner“. **Wann:** 25.–27.09., zwei Sitzungen, 30 Arbeitsschritte.

- Die alte Seite war aus der Cloud nicht abrufbar. Grundlage waren deshalb Handy-Screenshots, die Speisekarte als PDF und öffentliche Angaben. Alles Unsichere wurde markiert statt erfunden.
- **Variante 1 (dunkel):** Original-Logo mit Skyline, Bögen als Leitmotiv, Speisekarte mit Sprungmarken und Suche.
- **Variante 2 (hell und grün):** eigenes Vektor-Logo, sanftes Handy-Menü, Diashows. Barrierefreiheit 94 → 100, Tempo 94 → 96.
- Die beiden Sitzungen führten ein gemeinsames Protokoll und lernten voneinander. Daraus entstand die Idee des Brüder-Wettbewerbs.
- Später (29.09.) folgte in der Zentrale die **Meistervariante** als Generalprobe: komplett in 38 Minuten, 90 von 90 Preisen korrekt übernommen.

Elias' Entscheidung: Das Original bleibt unverändert. Die Logo-Frage wurde entschieden (Original-Skyline). Veröffentlicht wird nichts ohne Freigabe des Restaurants.

C3 Brüder-Wettbewerb (Hairstyle by Ümit, Friseur)

Was: Drei Claude-Sitzungen, „Bruder A, B und C“, bauen parallel je eine eigene Website für denselben Friseur. Jeder will gewinnen, aber Fehler und Erfolge werden offen geteilt. **Wann:** 26.–28.09., drei Sitzungen, 54 Arbeitsschritte.

BRUDER	STIL	BESONDERHEIT
A	Dunkel und edel wie ein Mode-Magazin am Abend, Gold aus dem Logo	schrieb die Regeln und Werkzeuge für alle
B	Farbig und verspielt: Petrol, Creme, Apricot, runde Formen	Lighthouse 99/100/100/100
C	Hell und ruhig: „Licht und Marmor“ aus dem neuen Salon	9 Prüfrunden, Jury 54 → 56 von 60

- Fairness-Regeln: niemand ändert die Arbeit eines anderen, jeder reserviert seinen Stil vorher, Übernahmen werden genannt.
- Bewertet wird nach erstem Eindruck, Eigenständigkeit, Bedienung auf dem Handy, Ruhe der Bewegung, Technik und Ehrlichkeit.
- Ergebnis für heute: sieben Schnellbefehle, Prüfwerkzeuge und die gemeinsame Fehlerliste, die in die Zentrale übernommen wurden.
- Am 28.09. war das Wochenkontingent an Rechenzeit aufgebraucht; die Sitzung von Bruder C endete deshalb. Seitdem arbeite ich sparsamer (Routine mit kleineren Modellen).

C4 Grundausrüstung und Fernspäher

Claude-Grundausrüstung (claude-setup)

Ein Einrichtungsskript, das jede neue Cloud-Sitzung gleich ausstattet: Arbeitsregeln, fünf Helfer (Recherche, Gestaltung, Technik, Test, Prüfung), Schutzregeln (keine Passwörter in Dateien, Rückfrage bei riskanten Befehlen, Änderungen vor dem Speichern anzeigen) und Browser-Werkzeuge zum Testen. Der erste Start am 27.09. scheiterte, danach lief es.

Fernspäherkommando

Ein Trupp aus einem Führer (Hfw Fortenbacher) und sechs Spähern, der eine fremde oder eigene Website von außen aufklärt: Optik, Technik, Sicherheit (nur beobachtend, nie angreifend), Funktion, Inhalte und SEO. Am Ende fasst ein Auswerter alles in einem Dossier zusammen.

Erster Einsatz, 28.09.: die Seite der Webflow-Agentur Legency Media. Befund: technisch und inhaltlich weit über dem Durchschnitt (lädt in unter einer halben Sekunde), aber mit Schwächen wie einer schwebenden Kopfleiste und einem Abzeichen, das Inhalte verdeckt. Daraus wurde gelernt, was eine Agenturseite hochwertig wirken lässt. Seitdem geht jeder Einsatzbericht in die Zentrale.

C5 Website-Business (OQ), die Zentrale

Seit dem 28.09. läuft alles in der Ablage „website-business“ zusammen. Bis heute: 55 Aufträge im Log, 40 Anträge (PRs), 133 Arbeitsschritte. Die wichtigsten Stationen:

A

B

C

D

E

F

G

H

- **28.09.:** Vorlage mit Bausteinen, Trainingsplan in 6 Stufen, drei Musterseiten, Außenprüfung durch die Späher.
- **29.09.:** KI-Bilder getestet, Generalprobe URFA in 38 Minuten, Portfolio in 33 Minuten, Notizen und Preisformeln, Business-Plan, Video-Auswertung, Portfolio überarbeitet.
- **30.09.:** Qualitätssystem, OSG-Neubau mit Jury, Preis-Einstufung, erfundene Fassung NORVAK, dieser Bericht.

A

B

C

D

E

F

G

H

C6 Alle gebauten Seiten

WEBSITE	ART	WOFÜR	STAND
URFA SOFRASI Variante 1 und 2	echtes Restaurant	erste Übung	fertig, Original unverändert
Hairstyle by Ümit, Bruder A, B, C	echter Friseur	Wettbewerb, Maßstab	fertig
Lotlinie	erfundene Physiopraxis	Musterseite „hell und ruhig“	Vorschau-Link
Zwischenbild	erfundenes Motion-Studio	Musterseite „laut und modern“	Vorschau-Link
Lindgrund	erfundener Uhrmacher	Musterseite „dunkel und edel“ mit KI-Film	Vorschau-Link
URFA-Meistervariante	echtes Restaurant	Generalprobe in 38 Minuten	fertig, kein Link
OQ-Portfolio	Elias' eigene Seite	Schaufenster mit Website-Generator	Vorschau-Link, Angaben teils Platzhalter
OSG-Neubau (8 Seiten)	echter Werkzeughersteller	große Probe mit Jury	zeigbar nur als erfundene Marke NORVAK

WARUM MANCHE SEITEN NICHT GEZEIGT WERDEN

Seiten echter Betriebe werden nicht veröffentlicht, solange der Betrieb nicht zugestimmt hat. Die Vorschau-Links aus den frühen Chats (URFA, Brüder) sind privat und nur für Elias. Für OSG gibt es eine Kopie unter dem erfundenen Namen „NORVAK“, die Elias zeigen darf. Alle Links stehen in Register H.

Was außerdem entstanden ist

- **Baukasten:** fertige Bausteine (Kopfbereich mit Film, Menü, Galerie, 3D-Effekt, Kontaktformular, Zahlung).
- **Prüfprogramme:** Tempo, Darstellung auf Handy und Computer, Sicherheit, Fehler; automatisch nach jeder Änderung.
- **14 Schnellbefehle** im Business, darunter Bestellung, Bauen, Prüfen, Abnahme, Sicherheit, Aufklärung, Wartung.
- **Betreuung:** ein wöchentlicher automatischer Check für künftige Kundenseiten.
- **Rechtsleitfaden:** Überblick über Gewerbe, Steuer, Verträge. Er ersetzt keine Beratung.

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

D

Arbeitsweise und Qualität

Wie aus einer Anfrage eine geprüfte Website wird, und der Beweis, dass es funktioniert.

D1 · Wie eine Website bei uns entsteht

D2 · Wie lange der Bau dauert

D3 · Wie wir Qualität prüfen

D4 · Die große Probe: OSG

D1 Wie eine Website bei uns entsteht

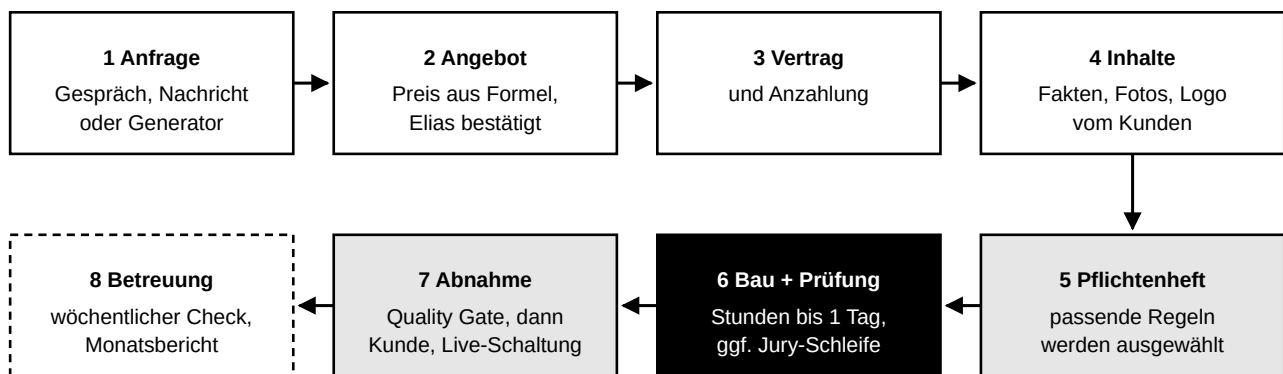


Bild 5 · Der Ablauf eines Auftrags. Schritt 6 (schwarz) ist der Teil, den Claude übernimmt; Schritte 2, 3 und 7 brauchen Elias.

D2 Wie lange der Bau dauert (gemessen)

ART DER SEITE	RICHTZEIT	BEISPIEL
Aus vorhandenen Bausteinen	unter 1 Stunde	Restaurant 38 min, Portfolio 33 min
Eigenes Design mit Feinschliff	rund 1 Tag	Friseur, Bruder C: 9 Prüfrunden
Firmenseite mit vielen Unterseiten	rund 10 Stunden	OSG, 8 Seiten, 5 Jury-Runden

Diese Zeiten sind nur möglich, weil in den Tagen davor Bausteine, Regeln und Prüfprogramme entstanden sind. Wartezeit entsteht sonst fast nur durch fehlende Inhalte des Kunden.

A

B

C

D

E

F

G

H

D3 Wie wir Qualität prüfen

Eine schöne Seite reicht nicht. Sie muss schnell laden, auf jedem Handy funktionieren, gefunden werden, für alle benutzbar und sicher sein. Dafür gibt es seit dem 30.09. ein **Qualitätssystem** mit drei Ebenen:

Ebene 1 · Regeln

125 Regeln in 11 Fachgebieten plus Mindeststandard. Jede Regel hat eine Quelle (z. B. Google, W3C, Gesetz) mit Prüfdatum.

Ebene 2 · Automatische Prüfung

Programme messen Tempo, Darstellung von 320 bis 1920 Pixel Breite, Fehler, Sicherheit, Kopfdaten.

Ebene 3 · Menschliches Urteil

Unabhängige Jury, Späher von außen, Quality Gate mit Beleg für jede bestellte Regel.

Bild 6 · Erst wenn alle drei Ebenen bestanden sind, gilt eine Seite als fertig.

FACHGEBIET	DIE FRAGE DAHINTER
SEO, Technical SEO	Findet und versteht Google die Seite?
Local SEO	Wird der Betrieb in seiner Stadt gefunden (Karte, Adresse, Bewertungen)?
GEO / KI-Suche	Können KI-Assistenten die Fakten korrekt wiedergeben?
Strukturierte Daten	Stehen Name, Adresse, Öffnungszeiten maschinenlesbar im Hintergrund?
CRO und UX	Findet der Besucher schnell, was er will, und meldet er sich?
Barrierefreiheit	Kann jeder die Seite benutzen, auch mit Einschränkung?
Performance	Lädt die Seite auf dem Handy schnell?
Analytics	Kann man Erfolg messen, ohne Besucher auszuspähen?
Sicherheit	Ist die Seite gegen Angriffe und Missbrauch geschützt?

EHRlichKEITSREGEL

Wir versprechen nie ein bestimmtes Google-Ranking oder eine Empfehlung durch KI. Versprochen wird nur, was messbar ist: Tempo, Technik, Barrierefreiheit, Sicherheit.

A

B

C

D

E

F

G

H

D4 Die große Probe: OSG

Als bisher härtester Test sollte Claude die Website eines echten Werkzeugherstellers (OSG, Göppingen) komplett selbstständig neu bauen. Danach bewertete eine Jury aus drei unabhängigen KI-Bewertern das Ergebnis. Ziel: mindestens 75 von 100 Punkten. Nach jeder Runde wurde verbessert.

Jury-Punkte je Runde (von 100)

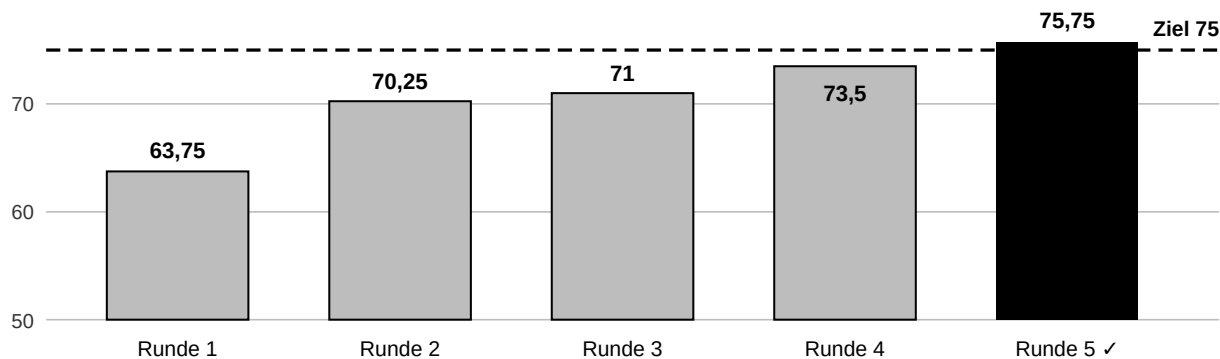


Bild 7 · Die Achse beginnt bei 50, damit die Unterschiede sichtbar sind. In Runde 5 war das Ziel erreicht; danach hat Elias die Schleife gestoppt.

Alte Seite gegen Neubau (Google Lighthouse, Handy, 0–100)

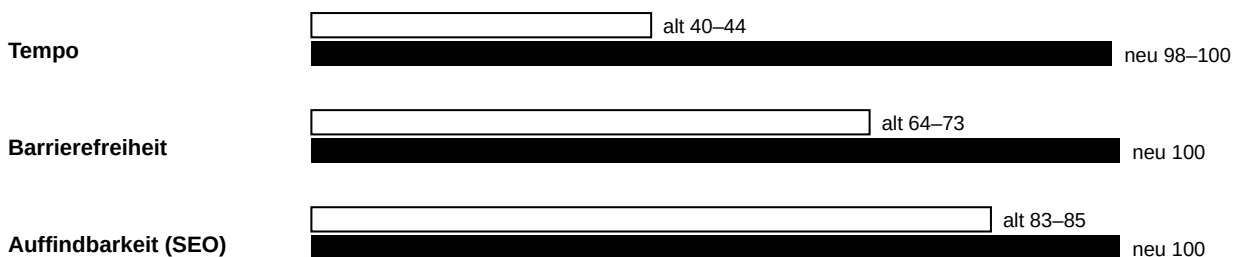


Bild 8 · Weißer Balken = alte Seite (gemessen am 30.09.), schwarzer Balken = Neubau. Die Seite lädt jetzt mehr als doppelt so schnell.

Ergebnis: 8 Seiten plus Rechtsseiten in rund 10 Stunden, alle Aufgaben für Besucher in höchstens 3 Klicks lösbar, keine Fehler bei der Barrierefreiheit. Verbraucht wurden 25 Higgsfield-Credits für KI-Bilder und Film.

Was die Jury noch bemängelt: Die Startseite ist auf dem Handy lang, die KI-Bilder wirken austauschbar (echte Firmenfotos wären der größte Gewinn), einige Texte sind dünn. Diese Liste wäre der Plan für eine sechste Runde, falls Elias sie anordnet.

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

E

Wissen und Lehren

Was ich in fünf Tagen und fünf Vorhaben gelernt habe, und wo es festgehalten ist.

E1 · Die wichtigsten Lehren

E2 · Wo das Wissen liegt

E1 Die wichtigsten Lehren

Ohne Technik erklärt. Jede Lehre steht als Regel im System, damit sie bei jeder neuen Seite gilt. In Klammern: wo sie entstanden ist.

1. **Das Handy zuerst.** Anrufen, Weg und Öffnungszeiten gehören in den ersten Bildschirm; ohne das verliert ein Betrieb Kunden. (URFA)
2. **Nichts erfinden.** Preise, Öffnungszeiten, Rechtstexte kommen nur vom Kunden. Unsicheres wird sichtbar markiert, bis es bestätigt ist. (URFA)
3. **Tempo ist Gestaltung.** Ein großes Bild, das zu spät lädt, kostet mehr als jedes Detail. Filme zeigen zuerst ein Standbild. (URFA, Brüder)
4. **Ruhige Bewegung wirkt edel, schnelle erschreckt.** Ein Menü in 0,2 Sekunden wirkt unruhig, 0,8 Sekunden mit sanftem Start hochwertig. Bei „das erschreckt mich“ zuerst das Tempo prüfen, nicht die Farbe. (URFA Variante 2)
5. **Mehrere Varianten schlagen eine.** Drei Brüder in verschiedenen Stilen zeigen mehr Möglichkeiten; der Chef wählt lieber aus. (Brüder)
6. **Wettbewerb mit offenen Karten.** Wer Fehler teilt, hebt das Niveau aller. (Brüder)
7. **Fehler nur einmal machen.** 56 Fehler sind dokumentiert, zum Beispiel lange deutsche Wörter, die über den Rand ragen. Vor jedem Bau werden sie gelesen. (alle)
8. **Ein fremder Blick findet mehr.** Späher und Jury fanden Schwächen, die beim eigenen Prüfen unsichtbar blieben. (Fernspäher, OSG)
9. **Von guten Agenturen lernen.** Die Aufklärung von Legacy Media zeigte, was hochwertig wirkt: enge Farbwahl, eigene Bildsprache, blitzschnelles Laden. (Fernspäher)
10. **Kein Tracking, keine Cookies.** Dann braucht die Seite kein Cookie-Banner. Das ist ein echtes Verkaufsargument. (Zentrale)
11. **Echte Fotos schlagen KI-Bilder.** KI-Bilder sind schnell, wirken aber leicht beliebig. Sie ergänzen, ersetzen aber keine Fotos des Betriebs. (OSG)
12. **Wissen veraltet.** Regeln von Google oder zu KI-Suchen ändern sich. Jede Quelle hat ein Prüfdatum; die erste Nachprüfung ist am 29.12.2026 fällig. (Qualitätssystem)
13. **Rechenzeit ist begrenzt.** Am 28.09. war das Wochenkontingent erschöpft und zwei Sitzungen blieben stehen. Seitdem: große Modelle nur zum Denken, Routine an kleinere. (Brüder, Fernspäher)
14. **Was bleiben soll, gehört in eine Datei.** Jede Sitzung vergisst am Ende. Deshalb gibt es Auftragslog, Fehlerliste, Gedächtnisnotizen und Berichte. (alle)
15. **Der Preis muss begründet sein.** Weil eine Seite so schnell entsteht, zählt der Wert für den Kunden, nicht die Minuten. (Preisformeln)
16. **Echte Firmen schützen.** Arbeiten für echte Betriebe nur mit deren Zustimmung zeigen, sonst als erfundene Marke. (OSG)

E2 Wo das Wissen liegt

SAMMLUNG	INHALT
Fehlerliste	56 Fehler mit Regel, damit sie nicht wieder passieren

A

B

C

D

E

F

G

H

SAMMLUNG	INHALT
Gestaltungswissen	Tempi, Bewegungskurven, bewährte Effekte, Scroll-Film
Meisterstandard	feste Grenzwerte für Technik, Gewicht, Bewegung, Wirkung
Qualitätsregeln	125 Regeln in 11 Fachgebieten mit 90 Quellen
Referenzen	Berichte über fremde Seiten und Videos, Muster-Katalog
Stolperfallen	was bei der Generalprobe URFA Zeit gekostet hat
Projekt-Gedächtnis	Notizen für künftige Sitzungen: Entscheidungen von Elias, Regeln, Links

A
B
C
D
E
F
G
H

A

B

C

D

E

F

G

H

F

Geld

Wie Preise entstehen und was bisher verbraucht wurde. Alle Euro-Beträge sind Platzhalter.

F1 · So entsteht ein Preis

F2 · Ideen von Elias, durchgerechnet

F3 · Was bisher verbraucht wurde


F1 So entsteht ein Preis

ACHTUNG

Alle Euro-Beträge in diesem Register sind Platzhalter. Sie zeigen, wie gerechnet wird, nicht, was verlangt wird. Die echten Werte legt Elias fest.

Jeder Baustein einer Seite hat Punkte (zum Beispiel Kontaktformular 4 Punkte, Film im Kopfbereich 14 Punkte). Die Punkte werden nach Bedeutung gewichtet (Funktionen zählen am meisten, Technik am wenigsten) und in Euro umgerechnet. Ein bekannter Betrieb zahlt etwas mehr, höchstens 15 Prozent. Zwei weitere Rechenwege dienen als Gegenprobe und als Untergrenze. So lässt sich dem Kunden jede Zeile seines Preises erklären.

Einmalpreis der Seite, Beispiele mit Platzhalterwerten (Euro)

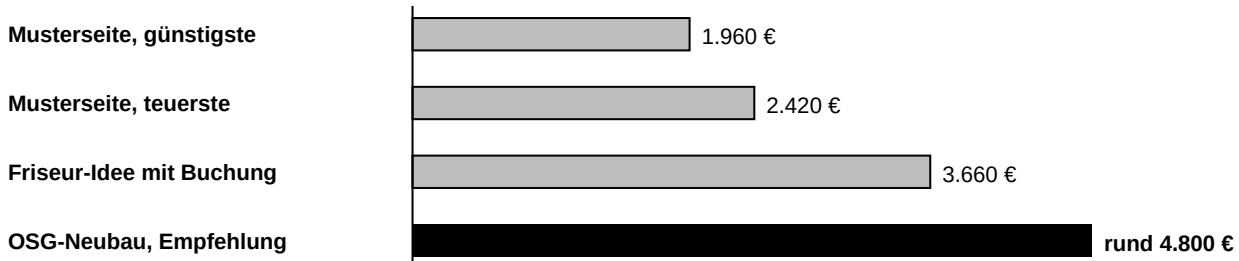

Monats-Abo (Beispiele): Basis 45 €, Plus 95 €, Premium 225 €. Rechenweg OSG: 5.740 € (Punkte) und 3.890 € (Bewertung), Untergrenze 2.010

Bild 9 · Je mehr Funktionen, Seiten und Bilder, desto höher der Preis. Die Spanne reicht mit Platzhaltern von rund 2.000 bis 4.800 Euro.

F2 Ideen von Elias, durchgerechnet

- **Profit-Chain:** Wer einen neuen Kunden bringt, bekommt Gratismonate im Abo, höchstens 6.
- **Treue:** Bestandskunden erhalten 1 Prozent Rabatt je 3 Monate, höchstens 10 Prozent. Alle Rabatte zusammen nie über 15 Prozent.
- **Mietmodell (Vorschlag):** keine Einmalzahlung, dafür höhere Monatsrate über 24 Monate.
- **Saison-Umgestaltung:** zum Beispiel eine Halloween-Aktion, danach Rückbau.
- **Rabatt für Google-Bewertung:** vermutlich nicht erlaubt. Vorschlag: stattdessen Rabatt für die Erlaubnis, die Seite als Referenz zu zeigen.

F3 Was bisher verbraucht wurde

POSTEN	VERBRAUCH
Higgsfield: Test von KI-Bild und KI-Film	7,50 Credits
Higgsfield: Film für das Portfolio	7,75 Credits
Higgsfield: Bilder und Film für OSG	25,00 Credits
SUMME HIGGSFIELD (ÜBRIG: 29,5 CREDITS)	40,25 CREDITS

Rechenzeit der sieben frühen Chats (URFA, Brüder, Grundausrüstung, Fernspäher): laut Sitzungsdaten ein rechnerischer Gegenwert von rund 277 US-Dollar. Das ist kein Rechnungsbetrag, denn die Arbeit lief über Elias' Claude-Abo. Die Zahl zeigt nur, wie viel Arbeit in der Vorarbeit steckt. Für die Sitzungen im Projekt liegt keine vergleichbare Summe vor.

Laufende Abos (Claude, Higgsfield) trägt Elias selbst. Hosting und Domain kosten noch nichts, weil noch nichts online ist.

A

B

C

D

E

F

G

H

G

Plan und Entscheidungen

Der Gesamtplan in sechs Phasen, wo wir heute stehen, und was als Nächstes kommt.

G1 · Der Gesamtplan und unsere Position

G2 · Was offen ist

G3 · Die nächsten Schritte

A

B

C

D

E

F

G

H

G1 Der Gesamtplan und unsere Position

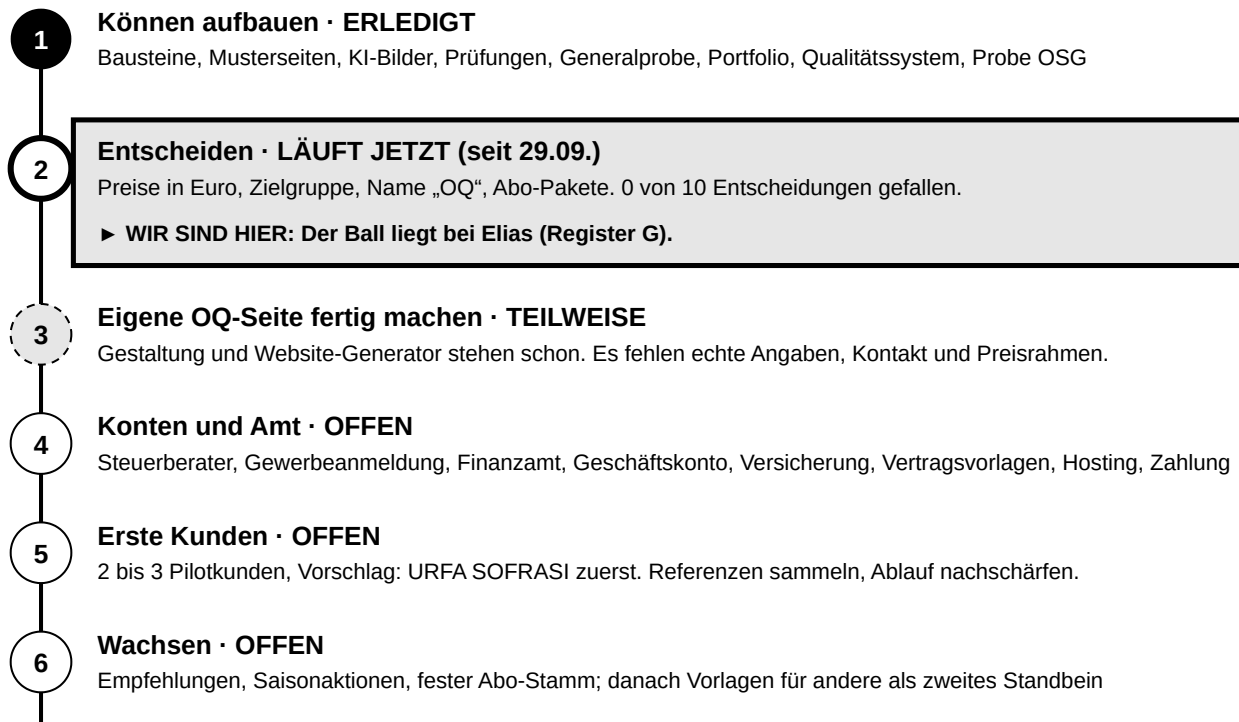


Bild 10 · Der Fahrplan von oben nach unten. Phase 1 ist abgeschlossen, Phase 2 wartet auf Entscheidungen von Elias.

WARUM WIR IN PHASE 2 STEHEN, OBWOHL GEBAUT WIRD

Während Phase 2 wartet, habe ich das Können weiter geschärft (Qualitätssystem, OSG). Das zählt zu Phase 1 und hält nichts auf. Weiter nach vorn geht es aber erst, wenn Preise, Zielgruppe und Name entschieden sind, denn davon hängen die OQ-Seite, die Verträge und die Gewerbeanmeldung ab.

A

B

C

D

E

F

G

H

G2 Was offen ist

Zehn Entscheidungen, die bei Elias liegen

NR.	FRAGE	MEIN VORSCHLAG
1	Wie wird der Preis gerechnet?	Punkte als Hauptweg, Bewertung als Gegenprobe, Aufwand als Untergrenze
2	Welche Euro-Werte?	als eigener Auftrag mit Marktvergleich
3	Rabatt für Google-Bewertung?	umwandeln in Rabatt für Referenzfreigabe
4	Welche Kunden?	kleine lokale Betriebe; Mittelstand wie OSG als Zusatz
5	Name „OQ“ festlegen?	ja, vorher Markenrecherche
6	Generator: Preisrahmen oder genauer Preis?	Preisrahmen, genauer Preis im Gespräch
7	Framer statt Higgsfield?	vorerst nicht, Higgsfield reicht
8	URFA als erster Pilotkunde?	ja, sobald Phase 4 steht
9	Qualitätsprüfung bei jeder Änderung automatisch, Besucherzählung ohne Cookies bauen?	ja, beides
10	OSG weiterführen?	ruhen lassen; NORVAK dient als Portfolio

Offene Arbeiten auf meiner Seite

- Baustein „Film läuft beim Scrollen mit“ fertig bauen und testen (A-046).
- OQ-Seite: dunkle Gestaltung und großer Einstieg für die ganze Seite, liegt auf Abruf (A-050).
- Besucherzählung ohne Cookies und automatische Qualitätsprüfung, nur mit Elias' Zustimmung (A-052).

Was nur Elias erledigen kann (für Phase 4)

- Termin beim Steuerberater, dann Gewerbeanmeldung und Fragebogen beim Finanzamt
- Geschäftskonto, Buchhaltungsprogramm, IT-Haftpflichtversicherung, Vertragsvorlagen vom Fachmann
- Konten bei Cloudflare (Hosting), Stripe (Zahlungen), Domain für OQ

A**B****C****D****E****F****G****H**

G3 Die nächsten Schritte




Bild 11 · Der kürzeste Weg zum ersten zahlenden Kunden.

Solange die Entscheidungen offen sind, kann ich weiter an Bausteinen und am Portfolio arbeiten. Das macht OQ besser, bringt uns im Plan aber nicht voran. Der wichtigste Hebel liegt deshalb bei den zehn Fragen in G2. Am schnellsten geht es, wenn Elias Frage 1, 2 und 4 zuerst beantwortet, denn davon hängen die meisten anderen ab.

Melde gehorsamst: Lage aufgenommen, Können steht, der nächste Zug liegt beim Chef.

Kommandeur Stahl, 30.09.2026

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

H

Anhang

Zum Nachschlagen: wo alles liegt, alle Vorschau-Links, woher die Zahlen stammen.

H1 · Ablageorte

H2 · Vorschau-Links

H3 · Quellen dieses Berichts

H1 Ablageorte

WAS	WO
Zentrale OQ	GitHub: website-business
URFA-Original	GitHub: urfa (bleibt unverändert)
Brüder-Wettbewerb	GitHub: -mit-3-Br-der-Website (je Bruder ein Branch)
Grundausrüstung	GitHub: claude-setup
Fernspäherkommando, Dossiers	GitHub: Fernsp-herkommando-Fortenbacher-
Business-Plan (ausführlich)	website-business, BUSINESSPLAN.md, und Seite „Business-Plan OQ“
Dieser Bericht, alle Register	website-business: ops/dokumentation/ · Projektordner: berichte/
Auftragslog	website-business: ops/auftraege.jsonl
Was nur Elias erledigen kann	website-business: ops/HAENDE.md
Qualitätsregeln und Quellen	website-business: wissen/fachgebiete/, wissen/quellen/
Preisformeln und Rechner	website-business: wissen/preismodell/
Elias' Notizen zu OQ	website-business: wissen/notizen/ · Projektordner: notizen/
OSG-Neubau, Jury, Preis	website-business: kunden/osg-germany/ · Projektordner: osg-neubau/

H2 Vorschau-Links (privat, nur für Elias)

SEITE	LINK
Business-Plan OQ	claude.ai/artifact/T9c4jsG2eA5AhRxUzVG4MU
OQ-Portfolio	claude.ai/artifact/8Yaq6z8EGEYNpf9SKEXjDE
Lotlinie (hell)	claude.ai/artifact/GYQVaC7TgP8Z2fAjCtfy4X
Zwischenbild (laut)	claude.ai/artifact/PNSQwB1akhuiLaAEQ9fQxu
Lindgrund (edel)	claude.ai/artifact/VanDW6vpaVBg4vuzmX5EgP
NORVAK (erfundene Fassung OSG)	claude.ai/artifact/Fsqu6D63SxNHwWi1VcLbHC
URFA Variante 1 (dunkel)	claude.ai/artifact/Qo99W1RFepBRnNZBE1FaxL
URFA Variante 2 (hell)	claude.ai/artifact/Kdt4rLqAS4ZiU26FRyzxF
Ümit, Bruder A	claude.ai/artifact/7gA1tz1fqyU3PjuK58Emx6
Ümit, Bruder B	claude.ai/artifact/56kKXLnVCFnECfSkFmHGC7
Ümit, Bruder C	claude.ai/artifact/W8DkZAgmECBMZym76uJ1Pi
Preisformel-Rechner	claude.ai/artifact/FatfhqZ6bJK97QCUXfRnEA

A**B****C****D****E****F****G****H**

H3 Quellen dieses Berichts

- Git-Historie aller fünf Ablagen (alle Branches), Stand 30.09.2026, 11 Uhr
- Liste und Zusammenfassungen aller Claude-Code-Sitzungen
- Auftragslog A-001 bis A-055, Projekt-Gedächtnis, alle Projekt-Threads
- Prüfberichte: Jury OSG, SEO/GEO-Vergleich, Preis-Einstufung, Qualitätssystem, Dossier Legacy Media

Dieser Bericht ist eine Orientierung, keine Rechts- oder Steuerberatung.

A

B

C

D

E

F

G

H

Einleger: Registerstreifen und Rückenschild

Streifen an der gestrichelten Linie ausschneiden und in die Laschen der Registerblätter stecken oder aufkleben. Das Rückenschild passt in einen breiten Ordner (etwa 8 cm Rücken).

A Überblick	B Chronik	C Projekte	D Arbeitsweise
E Wissen	F Geld	G Plan	H Anhang

oQ

Lagebericht · Website-Business

ab 30.09.2026

oQ

Lagebericht

2026
